

# RAPPORT

Urafikis rolle i byggeprosjektet *Projet communautaire: reconstruction de l'école primaire Kabonde*

Prosjektperiode 2020 – 2022



**Behandlet i styret 13.11.2023**

## **Innledning og kort historikk**

Denne rapporten er en videreføring av rapporten «Utbedrings- og utbyggingsarbeid på barneskolen EP Kabonde i Bukavu, Kongo i perioden 2015 – 2020»<sup>1</sup> som beskriver både nødvendig utbedringsarbeid i femårsperioden og begynnende utbygging av klasseromskapasiteten fra seks til tolv klasserom.



EP Kabonde har vært en en-parallell barneskole. Alle klasserom har vært bygget som enkle trebygninger. Elevtallet har steget kraftig de senere årene. Fra og med skoleåret 2018/19 har skolen årlig tatt opp to klasser på første trinn, mot tidligere bare en. EP Kabonde har dermed hatt behov for ett nytt klasserom årlig fra og med høsten 2018. Også de nye klasserommene har blitt bygget som trebrakker, for Urafiki har begrensede midler til rådighet samtidig som det er mange og store udekkete behov ved de ti Urafiki-skolene i Bukavu. De senere årene har EP Kabondes vennskapsskole, Rykene skole i Arendal, gitt årlige bidrag til utbygging av skolen.

Ved utgangen av 2020 hadde EP Kabonde åtte helt ferdig klasserom i trebrakker samt et nesten ferdig niende rom. Skolen hadde kontor i en egen liten bygning. I 2021 ble det niende rommet ferdigstilt og innredet med pulter ved hjelp av midler fra Rykene skole.

## **Byggeprosjekt i regi av Fond sosial de la RD Congo.**

I 2019-2020 ble det lyst ut et byggeprosjekt i regi av *Fond social de la RD Congo*. Man skulle bygge noen skoler i landlige områder og lokalmiljøer ble invitert til å søke. Det ble stilt store krav til kartlegging av forhold ved og rundt skolen, og EP Kabonde utformet en god og grundig søknad. Solid ledelse og et mangeårig godt samarbeid med foreldre var blant kriteriene. Natur- og miljø forhold i skolens nærområde ble også tillagt stor vekt. Det ble stilt krav om et bidrag fra skolen på 5% av totalkostnaden for prosjektet. Byggesummen var satt til USD 100.000 og skolens bidrag skulle med dette være USD 5000.

Styret i UBB<sup>2</sup> og styret i Urafiki N<sup>3</sup> besluttet at Urafiki skulle bidra med midler til egenandelen, og EP Kabonde oppfylte dermed alle kriterier.

Etter en litt utfordrende prosess ble EP Kabonde tildelt prosjektet som fikk tittelen «Projet communautaire: reconstruction de l'école primaire Kabonde». (Vedlegg)



<sup>1</sup> Behandlet i styret i Urafiki N 04.06.2020

<sup>2</sup> UBB: Urafiki Bukavu-Bergen, søsterorganisasjonen i Bukavu.

<sup>3</sup> Urafiki N: Urafiki Norge

Byggeprosjektet omfattet:

- \* 6 klasserom a 8 x7 m
- \* administrativ enhet med separate kontorer for rektor og sekretær
- \* 6 latriner i mur
- \* Innredning av klasserommene med pulter, tavler og innredning på lærerrom
- \* Datautstyr rektors kontor
- \* Innredning rektors kontor
- \* Avløp for vann tilpasset skolens størrelse
- \* Et lite solcelleanlegg




### **Frafall av krav om 5% egenandel - kjøp av tilleggsparsell**

Etter at EP Kabonde var tildelt prosjektet, ble kravet om 5% egenandel overraskende frafalt. Samtidig viste det seg at arealet som var tilgjengelig for nybygging var for lite. Bygget skulle oppføres i en etasje, og dette krever areal. Fond Sociae stilte derfor krav om utvidelse av tomten dersom prosjektet skulle kunne realiseres.

En liten parsell opp mot skolens grense var til salgs, og Urafiki N og UBB besluttet å kjøpe det nødvendige tilleggsarealet. Dette var mulig ved å omdisponere midlene som var avsatt til dekning av egenandelen.

Den nødvendige parsellen på vel 400 m<sup>2</sup> ble kjøpt for USD 3500 i april 2022. Disponibelt areal var med dette stort nok til at byggeprosjektet kunne gjennomføres.

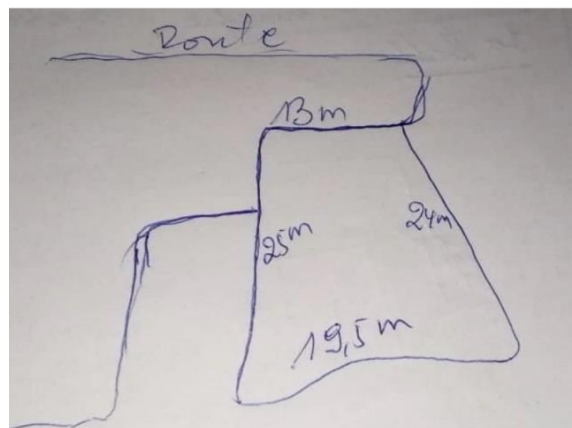

### **Byggeprosessen**

Byggeprosessen ble igangsatt i august 2022 og byggeperioden ble satt til fire måneder. Fond Social hadde hånd om alle sider ved selve byggeprosjektet. Takket være fleksibilitet fra alle involverte klarte rektor og lærere å holde skoledriften i gang gjennom hele byggeperioden. Dette klarte de blant annet ved at seks av klassene hadde undervisning før lunsj mens fem<sup>4</sup> klasser fikk sin undervisning etter lunsj.

Arbeidet var planlagt ferdig desember 2022, men trakk ut i tid. Våren 2023 trakk Fond Social seg helt ut av prosjektet. Årsaken skal ha vært problemer på høyeste nivå i organisasjonen.

<sup>4</sup> En av skolens lærere får ikke lønn fra staten og har derfor holdt seg hjemme. De to klassene på 6.trinn får undervisning i storklasse i påvente av løsning.



UBB v/ Rektor Gustave Murhula Shamungabo sendte følgende informasjon om gjenstående arbeid:

- Solcelleanlegget manglet fortsatt noen deler og var ikke ferdig montert.
- Urinalen var halvferdig.
- Kanalisering av avløpsvann manglet.



I samsvar med tilsendt budsjett bevilget Urafiki USD 700 til ferdigstilling, og i oktober 2023 var endelig hele prosjektet ferdig.

ET KADENNE  
MBIZA

DEVIS POUR FINISSAGE DE  
TOILETTES ET CORRECTION  
DE L'INSTALLATION SOLAIRE

I CARRELIAGE		PU(\$)	PT(\$)	OBSER
04	Matériau			
4	Carreau carré 20 x 20cm	20\$	80\$	
2	kg clou 4cm	3\$	6\$	
	Main d'œuvre	30\$	30\$	
II MAÇONNERIE				
800	Bricks		30\$	
6	Sac de ciment	12\$	72\$	
3	m <sup>3</sup> sable	19\$	57\$	
6	Porte ciment	2\$	6\$	
	Main d'œuvre	40\$	40\$	
III RECUPERATION DE L'EAU				
4	Écrou plastique	20\$	20\$	
2	Tuyau	12\$	24\$	
5	Coude	2\$	10\$	
	Main d'œuvre	80\$	20\$	
IV CORRECTION INSTALLATION				
3	Mètre de câble	10\$	30\$	
15	ampoules	3\$	45\$	
10	interrupteurs	10\$	100\$	
	Main d'œuvre		100\$	
	Transport		60\$	
	Loi de maintenance	11\$	22\$	
	<b>Total</b>		<b>700\$</b>	

Le 12/10/2023



### **Urafikis rolle i prosjektet**

Urafiki-partnerskapet har hatt følgende rolle i byggeprosjektet:

- Partnerskapets innsats gjennom mange år har lagt grunnlaget for tildeling av byggeprosjektet ikke minst gjennom bidrag til gradvise utvidelser av skolens tomt og gjennom bygging av nye, enkle klasserom etter hvert som elevtallet har økt.
- Urafiki bevilget midler til egenandelen på USD 5000 i byggeprosjektet, et beløp som senere ble omdisponert til kjøp av en liten tilleggsparcell. (Se over)
- Urafiki bevilget penger til ferdigstilling av byggeprosjektet da Fond Social trakk seg ut våren 2023.

### **Status ved EP Kabonde etter fullført byggeprosjekt**

Gjennom prosjektet har EP Kabonde fått seks klasserom, lærerrom og kontorer samt seks latriner, alt i mur. Klasserom, lærerrom og kontorer er innredet. De har også fått avløp for vann tilpasset skolens størrelse og et enkelt solcelleanlegg.

Men EP Kabonde har fortsatt mange bygningsmessige og praktiske utfordringer<sup>5</sup>:


- Skolens totalbehov er 12 klasserom, men byggeprosjektet som denne rapporten omhandler var avgrenset til seks klasserom. De øvrige seks undervisningsrommene vil fortsatt være i trebrakker.
- De fleste av de eksisterende klasserommene i trebrakker måtte rives før byggestart for å gi plass til nybygget. Fem av dem ble bygget opp igjen av rivningsmaterialene på en annen del av tomten, men mangler fortsatt skillevegger mellom noen rom, en del vinduer, dører og noe kledning. To av rommene er dessuten veldig små. Ved prosjektets avslutning mangler fortsatt ett klasserom for at skolen skal få dekket sitt behov på 12 klasserom.
- Det var en del murstein og sement til overs mot slutten av arbeidet. Rektor benyttet umiddelbart muligheten til å støpe gulv i et av klasserommene, et arbeid han tok tak i selv. Ønsket er murgulv i alle tre-bygningene.



---

<sup>5</sup> Skolen mangler også lærebøker og ulike typer undervisningsmateriell.

- En annen stor utfordring er den lille private parsellen på ca. 150 m<sup>2</sup> som skjærer inn midt i tomten. (Se bilde t.h. nedenfor). Skolens ønske er å kjøpe og innlemme denne parsellen i skoleområdet.



- Vannforsyningen er problematisk. EP Kabonde hadde allerede en vanntank for samling av regnvann.<sup>6</sup> I tillegg inngår en vanntank for innsamling av regnvann i byggeprosjektet som er beskrevet i denne rapporten. Disse to vanntankene er likevel ikke nok til å dekke skolens behov for renhold. Skolens sterke ønske er derfor å bli koblet til vannverket REGIDESO.

Løsninger på disse utfordringene ligger utenfor prosjektet som omtales i denne rapporten.

Rapporten er også tilgjengelig på Urafikis hjemmeside [www.urfiki.no](http://www.urfiki.no)

---

<sup>6</sup> Gave fra Urafiki-venner ved oppstarten av korona-pandemien.
